

SUJET

**Pôle
Bâtiment**

47- FERBLANTERIE - COUVERTURE

Epreuve Organisée par :

**CFA des Compagnons du
devoir**

2 Rue Jules Verne

BP 6

35700 RENNES

BAREME DE NOTATION

Nom :		Métier :
Prénom :		N° du candidat :

EPREUVES	CRITERES D'EVALUATION	NOTES
Ardoise	Aspect général	/10
	Traçage des pureaux	/5
	Traçage des arêtières	/20
	Pose de l'ardoise	/20
	Taille des ardoises	/15
	Remplissage	/20
	Etanchéité	/10
	TOTAL :	/100
Joint debout	Egout à larmier	/30
	Egout dégorgé	/30
	Relief de tête	/40
	TOTAL :	/100
TOTAL GLOBAL :		/200

Joint debout : (Pour l'appréciation des différents raccords, prendre en compte à chaque fois : le traçage, le pliage, l'aspect final)

- FERBLANTERIE - COUVERTURE -


SUJET 1

Réalisation d'une maquette en ardoise

Temps alloué : 5 heures

Descriptif :

- Exécution d'un arêtier en ardoises biaises, posées aux crochets, avec remplissage sur le plan carré sur 7 rangs avec environ 170 ardoises.

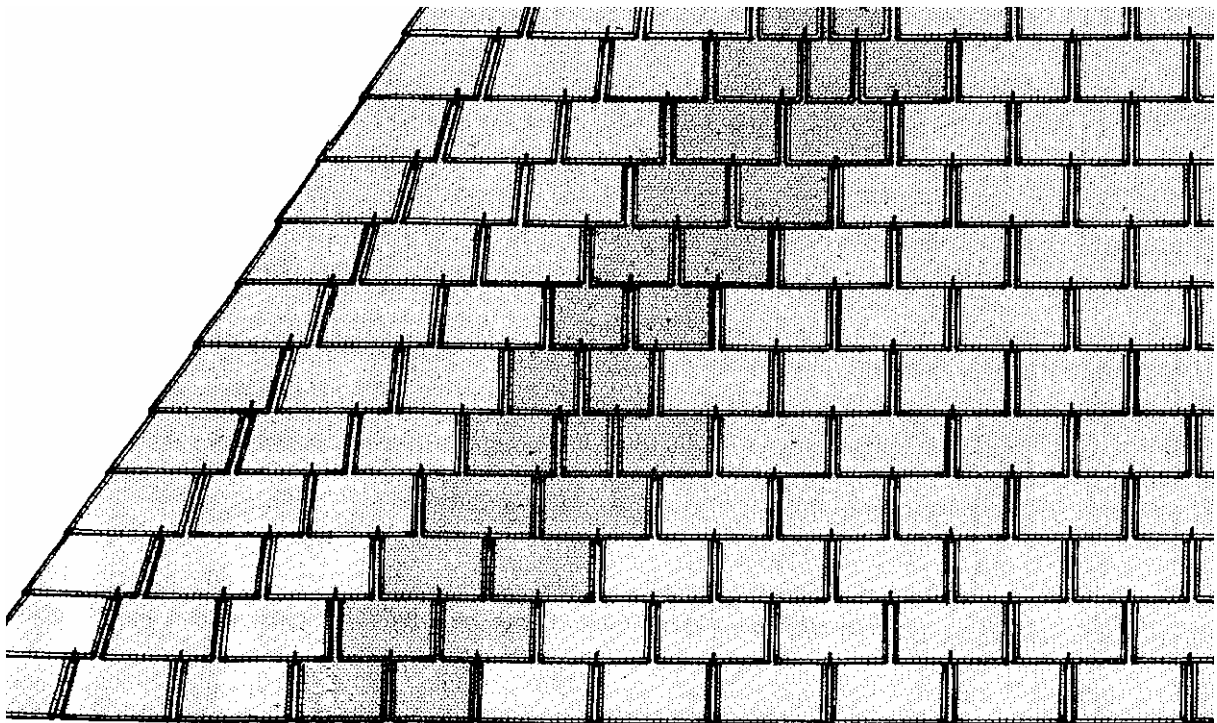

- FERBLANTERIE - COUVERTURE -




SUJET 2

Réalisation de plusieurs raccords de joint de bout.

Temps alloué : 3 heures (1h00 par raccord)

Descriptif :

- Exécution de différentes sortes de raccords en joint de bout.
- L'utilisation des livres de joint debout pour le détail des raccords est autorisée.

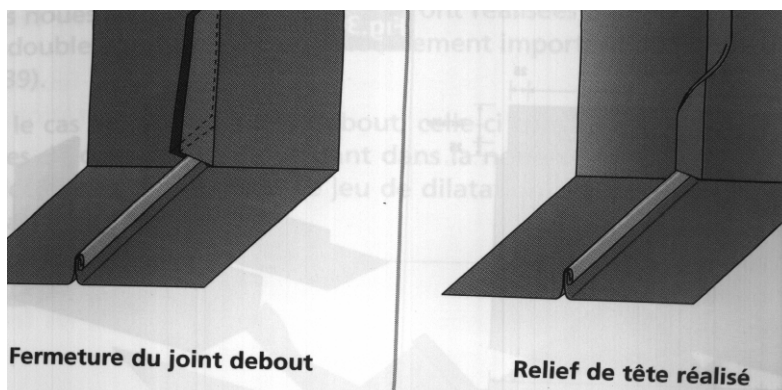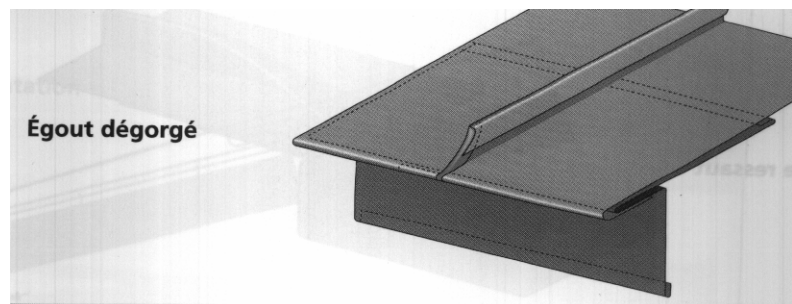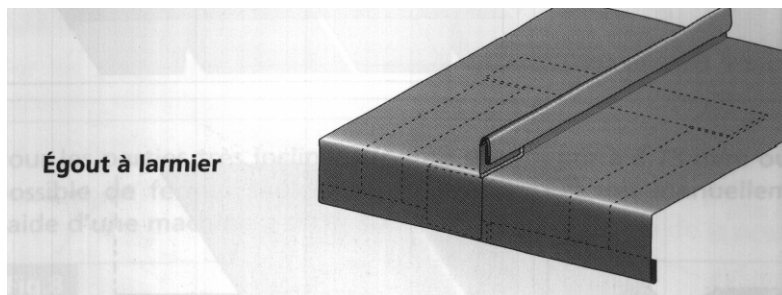

- FERBLANTERIE - COUVERTURE -

LISTE DES MATERIAUX Par candidat

Désignation des matériaux	Unité
- Ardoises aux choix	170u
- Crochets ardoises aux choix	150u
- Clous ardoise	50g
- zinc	0,4m/0,6m X 6
- Bande d'égout à Joint debout	1m
- Bande d'équerre pour larmier	1m
- Patte à joint debout profil 2	10u
